

	DAILY REPORT					
	HARI/ TANGGAL PM PIC		Jumat, 31 Januari 2025 Abdul Mudzakir M Ramdan Suprayogi			

MANPOWER	QTY				Total Manpowe	Total Hours	Title Project	PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON-SEMARANG TAHAP 2 RUAS BATANG – CIREBON – KANDANG HAUR TIMUR)
	TLB	Open Cut	Rojok	Katrek				
PM					0		No. Kontrak	SO-000011-CSM-I-2025
SPV	1				1			
QA/QC	1				1			
Tukang	4				4		No. Doct	PMRK-PRD-DLY-009

CUACA	Normal	07.00	09.00	11.00	13.00	15.00	17.00	Over Time	18.00	20.00	22.00
Hujan Gerimis											
Hujan Sedang											
Hujan Lebat											
Mendung											
Cerah		√	√	√	√	√	√				

No	EQUIPMENT	QTY	HOURSE
1	Rodder Stik		
2	Meteran		
3	Vernier Caliper		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

No	KENDALA	SOLUSI
1	Subduct Tertimbum	Menggali Tanah
2	Lalu-Lalangnya Excavator	Menunggu Excavator
3		
4		
5		
6		
7		

JOB DESCRIPTION										
No	ITEM	QTY Plan	unit	QTY Prev	unit	QTY Today	Unit	QTY Comm	Unit	Per %
1	Pekerjaan ROW Pertagas									
	- Open cut manual	18.000	meter		meter		meter	0,0	meter	0,00%
	- Laying FO cable (40000 meter)	40.000	meter		meter		meter	0,0	meter	0,00%
	- Boring manual crossing	2.000	meter		meter		meter	0,0	meter	0,00%
	- Pembuatan box Control	5	box		box		box	0,0	box	0,00%
	- Enclosure	10	unit		unit</					

	DAILY REPORT		
	HARI/ TANGGAL PM PIC	Jumat, 31 Januari 2025 Abdul Mudzakir M Ramdan Suprayogi	

Dokumentasi :



Test Menggunakan Rodder Stik KP 277+750



Test Menggunakan Rodder Stik KP 277+750



Test Menggunakan Rodder Stik KP 277+750



Test Menggunakan 2 FO KP 277+750



Test Menggunakan 2 FO KP 277+750



Test Menggunakan 2 FO KP 277+750




Test Menggunakan 2 FO KP 277+750



Test Menggunakan 1 FO KP 277+750



Test Menggunakan 1 FO KP 277+750

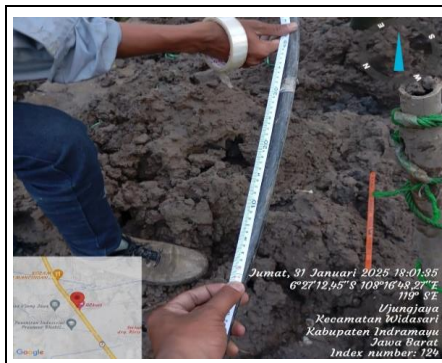


Test Menggunakan 1 FO KP 277+750

Remark :

--

Dibuat :

PT. Pasopati Rekadaya

 Ramdan Suprayogi

Disetujui :

KSO Timas-Pratiwi
